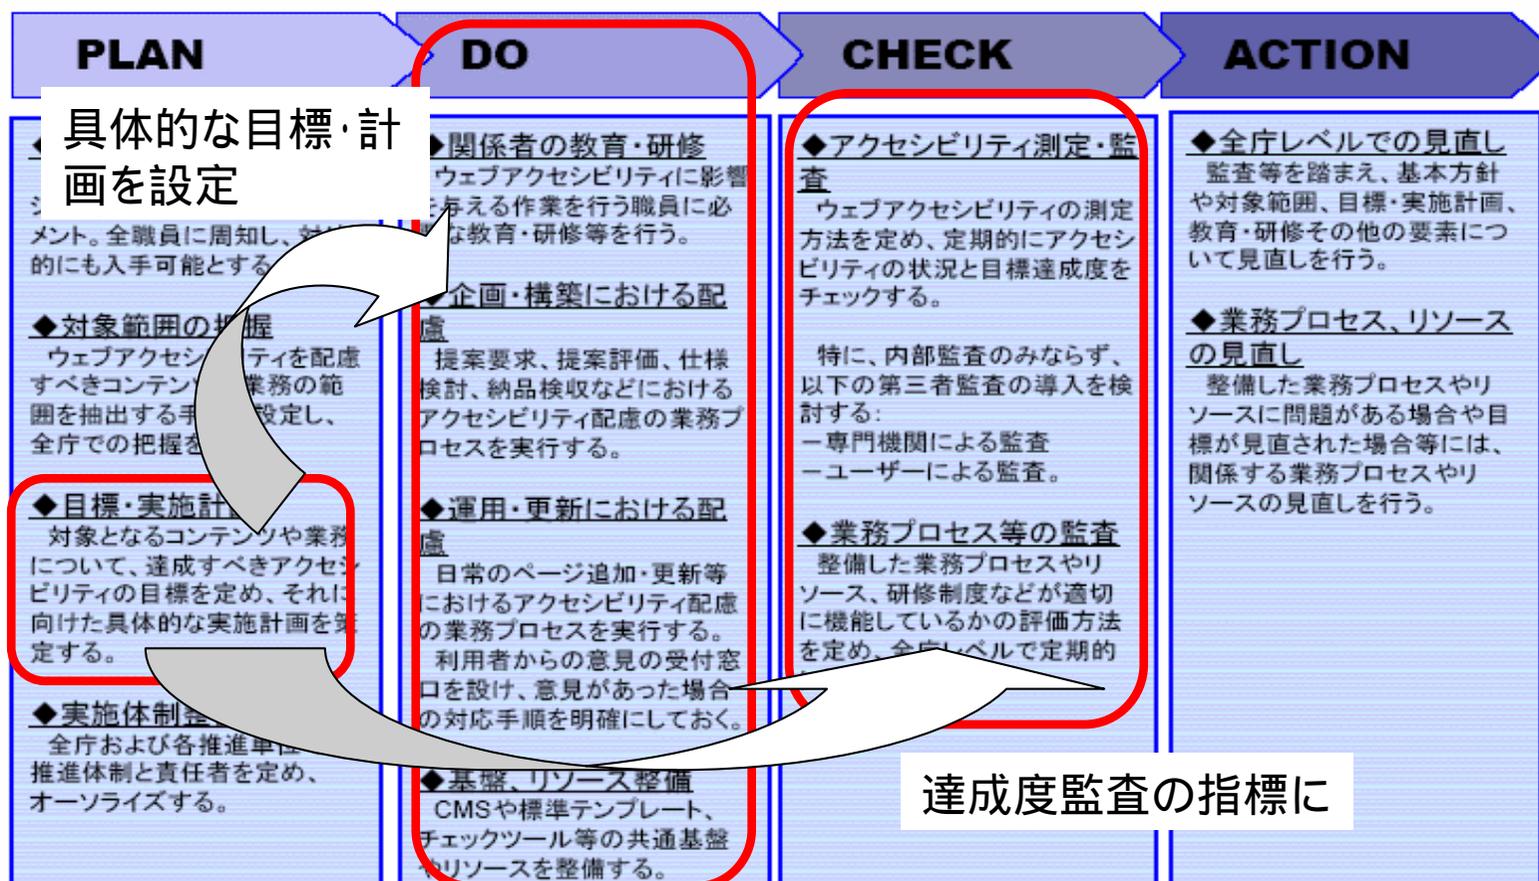

目標・実施計画設定ガイド(案)

2005年10月7日

「公共分野におけるアクセシビリティの
確保に関する研究会」事務局

■ 策定の目的

- ウェブアクセシビリティ配慮の対象となるコンテンツや業務について、それぞれ個別に達成すべき目標、到達スケジュールなどを出来るだけ具体的に設定します。
- 定期的アクセシビリティ確保状況をチェックする際に、上記で設定した目標・計画を指標として達成度の監査を行います。監査の結果、必要に応じて目標・実施計画の見直しを行います。



■ 策定の考え方

- 以下の項目について、対象となるコンテンツ・業務ごとに個別に設定します。

対象範囲	<p>ウェブコンテンツの場合は、サイト全体をひと括りに対象とするほか、コーナーや階層などで範囲を示してそれぞれ別の目標や実現期日を設定することが考えられます。</p> <p>また、研修などの場合、職員の役割ごとに目標レベルや実現期日を設定することが考えられます。</p>
目標	<p>ウェブコンテンツの場合は、アクセシビリティ確保の実現レベルを目標として設定します。研修などの場合は、対象者の理解すべき内容やそれによりどのような業務改善が期待されるかを目標として設定します。コンテンツの種類や目的によって目標とするレベルが異なる可能性も考えられます。</p> <p>また、CMSやテンプレート、制作ソフトや点検ツール、チェックリストの基盤整備業務の場合は、それらによってどのような業務改善が期待されるかが目標となります。</p>
実現期日	<p>設定した対象範囲ごとに、目標を実現する期日を設定します。一度に広範な対象に対して目標を実現するアプローチと、段階を踏んで目標を実現する対象を増やしていくアプローチが考えられます。</p>

■ 設定の例(ウェブコンテンツの場合)

対象 コンテンツ	配慮実践 範囲	配慮実践 レベル	実施期日		監査実施時の進捗		
			プロセス 着手	調達 完了	2007年3月	2008年3月	2009年3月
公式ホーム ページ	トップページ	公開中のものについて、 レベル1を目安に最低限 の修正を実施	2006年7月	2006年12月	完了	-	-
		新規調達により、レベル 2も含めた対応	2006年12月	2007年7月	基本検討 (調達仕様 完了)	完了	-
	上位3階層	新規調達により、レベル 2も含めた対応	2006年12月	2008年3月	基本検討 (調達仕様 完了)	完了	-
	各課が制作を 担当するペー ジ	公開中のものについて、 レベル1を目安に最低限 の修正を実施	2006年7月	2008年3月	アクセシビ リティ基準整 備完了	完了	-
		新規調達により、レベル 2も含めた対応	2007年4月	2009年3月	-	5割程度に おいて完了	完了
電子申請シ ステム	全て	レベル2を含め出来る限 りの対応(機能要件との 兼ね合いから調達時に 詳細を検討)	2007年7月	2009年3月	-	基本検討 (調達仕様 完了)	完了

■ 設定の例 (職員研修の場合)

研修対象	研修のレベル	実施期日		監査実施時の進捗		
		検討着手	研修実施	2007年3月	2008年3月	2009年3月
調達・運営、制作などに関わる全職員	配慮の必要性の理解	2006年7月	2006年11月	完了	-	-
ホームページ運用チームの責任者、情報発信各部署の責任者	JIS規格の理解	2006年7月	2006年11月	完了	-	-
	庁内プロセス、庁内ドキュメントの理解	2006年12月	2007年7月	研修プログラム整備完了	完了	-
	チェックツールの活用方法の理解	2006年7月	2006年11月	完了	-	-
制作を担当する職員	HTMLの基礎研修	2006年12月	2008年3月	企画検討着手段階	完了	-
	アクセシビリティ配慮制作技法の演習	2007年7月	2009年3月	-	研修プログラム整備完了	完了
	チェックツールの活用方法の理解	2006年12月	2008年3月	企画検討着手段階	完了	-
